



ORGANIZACIÓN
DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LA EDUCACIÓN,
LA CIENCIA Y LA CULTURA

Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura
Oficina de La Habana



EL PALACIO DEL SEGUNDO CABO EN MAYO 2014

Visita al sitio de obras el día 19 de Mayo 2014.

DUE:	Herman Portocarero, Ana Gualarte
UNESCO:	Herman van Hooff, Víctor Marín, Yanet Toirac, Elba Suárez
OHCH:	Nelys García, Anabel Marrero/Dirección de Cooperación Internacional. Norma Pérez Trujillo, Iván García, Diana Guerra, María del Carmen Pérez/ Unidad inversionista Vivian Álvarez/ Dirección General de Proyectos Lesbia Méndez, Yainet Rodríguez/ Dirección de Patrimonio Cultural Equipo de constructores



El mes de mayo 2014 ha sido decisivo para el proyecto *Rescate Patrimonial y Desarrollo Cultural en La Habana: Palacio del Segundo Cabo*: a 53 meses de iniciado se han tomado nuevas decisiones. Ya el 9 de abril, al final de una visita realizada por los altos representantes de la UNESCO y de la Delegación de la Unión Europea (DUE) en Cuba, se valoraron los avances de las obras y el ritmo de ejecución e intensidad de numerosos obreros: La DUE y UNESCO analizaron con la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana (OHCH) al final de ese encuentro la conveniencia de una nueva visita en mayo para decidir acciones antes de la fecha de cierre acordada para 30 de junio 2014. Se acordó además la posible convocatoria en mayo, para una 4^{ta} sesión del Comité Gestor para decidir sobre la forma y modo de concluir el proyecto.





OHCH explicando las salas y su uso

En mayo, la visita a la obra tuvo lugar el día 19, como paso previo a la convocatoria del 20 de mayo para la 4^{ta} sesión del Comité Gestor destinada a evaluar el avance logrado y posible extensión del proyecto. Durante la visita, las contrapartes recorrieron el sitio de obras, conocieron amplios detalles de ejecución, compararon el estado actual de los espacios y los planes en proceso para su uso final, y apreciaron una nueva valla informativa creada por OHCH.



Se explicaron en el terreno las mediciones que ejecuta la Empresa Nacional de Investigaciones aplicadas (ENIA/MICONS), en seguimiento al monitoreo de los desplazamientos estructurales del edificio, como parte de un paquete de soluciones alternativas que sustituye el uso de los micropilotes de refuerzo, antes considerado en la 2^{da} sesión del Comité Gestor, y que en octubre de 2012 conllevó al ADDENDUM 1 que extendió el proyecto 18 meses adicionales, respecto a los 36 meses expresados en el convenio de noviembre 2009. La seguridad estructural y el *uso óptimo y seguro* del Palacio es básica para el Resultado esperado 1 del Proyecto (*Restaurado el Palacio del Segundo Cabo permitiendo su uso óptimo y seguro*). La OHCH explicó la estrategia desarrollada para ello.



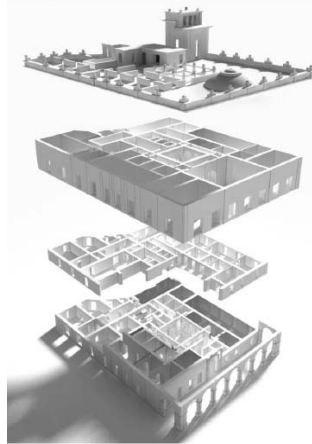

4^{ta} sesión del Comité Gestor el día 20 de Mayo 2014 en la sede UNESCO La Habana.

Asistentes

- DUE:** Janet Coto, María Queralt y Ana Guallarte
- OHCH:** Nelys García, Lesbia Méndez, Norma Pérez Trujillo, Onedys Calvo y Yainet Rodríguez,
- UNESCO:** Herman van Hooff, Fernando Brugman, Ransom Atud, Victor Marín, Claudia Reig y Elsa Martín

La reunión comenzó con el saludo y bienvenida del Director de la Oficina de la UNESCO en La Habana, quien presentó la agenda,

Luego fue analizado el informe de implementación del período 15.04.2013 – 15.05. 2014. Su preparación tuvo en cuenta intercambios, las visitas técnicas y los informes de seguimiento de la OHCH y otros aspectos en el Resumen ejecutivo y las diferentes secciones. Seguidamente la Arq. Norma Pérez mostró por OHCH los estudios y avances de diseño para diversas salas de uso cultural previstas para el Palacio Il Cabo.



La OHCH presentó cronograma detallado para la ejecución de la obra, donde se exige a los constructores la entrega del edificio terminado para junio.

El análisis del tema y la viabilidad de las fechas, conllevó a un debate sobre factibilidad llegándose a considerar la posibilidad de una nueva extensión a solicitar por parte de OHCH y UNESCO, la que tras el análisis fue acordada hasta finales de octubre 2014 y respaldada por una solicitud formal del Historiador de la Ciudad de La Habana. En respuesta a la DUE, la OHCH también explicó sobre la situación estructural actual del palacio tras el cambio de los micropilotes y la decisión de aplicar otras soluciones y para ello mostró los resultados del informe técnico sobre el control de los desplazamientos y del asentamiento del Palacio preparado por la ENIA-MICONS.

El Coordinador del programa de Cultura de la Oficina de la UNESCO en La Habana, explicó el informe financiero que fue preparado por la UNESCO, señalando que al finalizar el 5to Contrato con la OHCH se han utilizado todos los fondos de la contribución de la Unión Europea, incluyendo los fondos adelantados por la UNESCO correspondientes a la 4^{ta} y última entrega que la DUE realizará a la finalización del proyecto, así como también ha sido mayor el aporte de fondos y servicios por la OHCH. En este sentido, para concluir con las acciones previstas en el proyecto y que están relacionadas con el completamiento de la compra del equipamiento cultural para la sala polivalente, la UNESCO aportará además \$63,000.00 USD a este fin que serán ofrecidos desde su propio programa.



La DUE indicó que para el análisis del informe se empleara el marco lógico, tal como fue revisado en el Addendum N^o 1 del Convenio, para poder monitorear mejor los avances de la ejecución y las posibles medidas a tomar.

El Sr. Herman van Hooff Director de la Oficina de la UNESCO, al concluir la presentación del informe indicó que este constituía un borrador para el análisis de las Partes y abrió el debate sobre las acciones a tomar. Ver documentos anexos.

- [El informe de implementación presentado con las correcciones indicadas, así como el cronograma de ejecución REAJUSTADO para el proyecto y el Acta de la reunión del 4^{to} Comité Gestor son adjuntados para facilitar la mejor información.](#)
